



Eirik Larsen <eirik.larsen@kodeworks.no>

Løypemelding

per@sunlitsea.no <per@sunlitsea.no>
To: investors@sunlitsea.no

Sat, Apr 18, 2020 at 9:17 PM

Hei,

Statusoppdatering fra Sunlit Sea følger.

Prototyp 1 har blitt ferdig utviklet og sjøsatt på Bestumkilen. Ganske kjapt etter sjøsetting fikk vi testet den i ruskete vær, 13 sekundmeter og over 20 i kastene. Videoen taler for seg selv:


<https://drive.google.com/file/d/1WY2T2UeAnRejyPzO78kjoFDomjSR3j8R>

Størrelsen på flottørene i prototypen er 1x1 m2, i motsetning til 2x2 m2 som kommer til å være dimensjonen på det endelige produktet. Det betyr at de relativt små bølgene i videoen er ekvivalent med dobbelt så store bølger for det endelige produktet. Selv under disse forholdene var forankringslinen ganske slakk, noe som er bra. Stadt Towing Tank og Multiconsult applauderer tilsynelatende meget gode hydrodynamiske egenskaper, basert på deres tolkning av videoen.

På videoen kan man se små hvite rør ved hver flottør. Disse er vår custom sensorløsning, p.t bestående av Arduinoer med egenutviklet software som samler data fra hver flottør og sender til vår skyløsning for videre prosessering. Vi jobber nå sammen med Kodeworks og UiO - matematisk institutt med videre prosessering av disse dataene. Blant annet skal det gjøres estimat av bevegelse i Z retning for flottørene, estimering av gjeldende bølgelikning, etc. Solcellene man ser på prototyp 1 er billige kinesiske paneler. Vi ville teste hvor godt disse tålte vann (de skulle være IP67). De varte dessverre kun en kort stund, så det blir første og siste bestilling av paneler av denne typen. Man kan også skimte en hyggelig hilsen fra en glad and på en av panelene (fugleskit), dette kun etter et par dager. Det er en påminnelse at dyr og fugler kommer til å bli et reelt problem som må løses, og understreker viktigheten av å digitalisere løsningen. Det gjenstår å måle med sensoravlesninger hvilket faktisk produksjonstap dette utgjør.

Samtidig har vi jobbet aktivt i parallell med utvikling av prototyp 2. Den store forskjellen på prototyp 1 og 2 er at prototyp 2 gjøres med "deep drawing" av aluminium, og blir dermed den første testen av at vår tenkte produksjonsteknikk "holder vann". Accura i Birmingham leverer detaljutforming av "kopp" for sammenkobling av overdel og underdel i flottøren, som er et av de mer krevende delene av designet. CEiiA i Portugal sammenstiller dette designet med videre design av flottøren som helhet, og gjør finite element analysis etc av helheten (med mer). Dette forventes å pågå i ytterligere 6 uker før det endelige prototyp-designet sendes tilbake til Accura. Accura skal så lage prototyp 2 med et spesialdesignet pressverktøy. Her er noen bilder som beskriver hvordan CEiiA jobber.

A02 – T1 – SIZING STARTING GEOMETRY

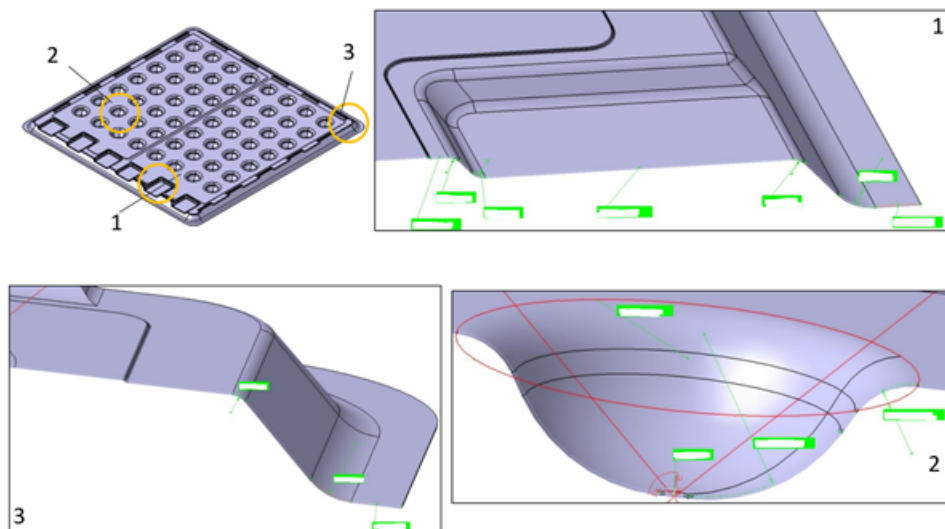

Når det gjelder finansiering har vi fått på plass et *oppstartslån* fra Innovasjon Norge med veldig gode vilkår. Dette er vanligvis forbeholdt bedrifter som ikke har mottatt kommersialiseringstilskudd fra før, som vi har, men i disse coronatider har de fått dispens til å gjøre unntak. Oppstartslånet er på 2.4 MNOK, i tillegg har vi siden sist solgt aksjer for 325 KNOK.

Vi jobber videre med søknader til Forskningsrådet (Innovasjonsprosjekt for Næringslivet), og mot Innovasjon Norge (Innovasjonskontrakt). I tillegg venter vi svar fra EIC Accelerator kontrakten levert til EU for noen uker siden. I nær framtid vil det også bli aktuelt å hente støtte fra Enova.

Vi følger opp flere spennende leads i nærområdet. Neste uke er det blant annet møte med Energy Valley hvor de ønsker å se på muligheten for kjøpe prototyp 2 prosjektet i samarbeid med noen i nettverket til Energy Valley. Vi har blitt kontaktet av NEL Hydrogen som vil møtes for en prat om bruk av flytende solkraft til elektrolyse i havsnære lokasjoner.

Den mest spennende leaden p.t er Eidos Eiendomsutvikling, for byggeprosjektet ved Lierstranda (Fjordbyen: <https://www.fjordbyenlierdrammen.no/>). Vi har nå en signert intensjonsavtale, og hadde møte med dem tidligere denne uken. Gitt at godkjenninger etc faller på plass ligger det an til at vi kan vinne en kontrakt med dem for leveranse av 1MW til neste sommer. Mest sannsynlig blir dette en PPA (power purchase agreement), som betyr den første gjentakende månedlige inntektsstrømmen for Sunlit Sea, noe som er et signal mange investorer ser et etter.

Angående Pakistan så har vi kartlagt en god del rundt å gå inn og etablere en branch der, men vi holder fortsatt på med due diligence og kost/nytte-vurderinger av denne strategien.

Teamet som jobber med Sunlit Sea nå framover er:

Per Lindberg, 100%

Eirik Larsen, 70%

Graham Muter, 50%

Ahsan Sarwar, 30%

Thomas Ax, 30%

CEiA, 80%

Accura, 20%

Stadt Towing Tank, 20%

Angående corona viruset så ser det så langt ut til å ikke ha hatt noen negative effekter for Sunlit Sea - faktisk heller det motsatte da vi ser at støttemidler av ulik art sitter løsere.

Mvh

Per Lindberg PhD

Sunlit Sea AS

per@sunlitsea.no

+47 970 79 523
