



Eirik Larsen <eirik.larsen@kodeworks.no>

Løypemelding

Per Lindberg <per@sunlitsea.no>
To: investors@sunlitsea.no

Sat, Jan 8, 2022 at 7:18 AM

Hei,

Løypemelding fra Sunlit Sea følger.

Emisjonen i nov-des 2021 nådde ikke minimumsbeløpet på 10 MNOK. Vi fikk tegninger for totalt 2,048 MNOK hvorav 1 MNOK var fra én ny aksjonær. Av de som tegnet seg for emisjonen ønsket totalt 650 000 NOK å stå ved tegningen på tross av at emisjonen ikke nådde minimumsbeløpet.

På kort sikt får ikke den begrensede kapitalinnhenting noen umiddelbare konsekvenser. For å kompensere gjør vi følgende:

- Reduksjon i månedlige kostnader: 2 innleide utviklere som jobber med dataprosessering, robotikk og webtjenester vil inntil videre forlate prosjektet fra 1. februar. Dette gjør at vi vil ha svakere progresjon en periode på disse områdene; men vi vil kunne hente inn den tapte fremdriften senere.
- Vurdering av lånemuligheter: Vi har dialog med aktører som kan inngi ansvarlige konvertible lån. I første omgang er det aktuelt å låne 1 MNOK for å forløse 1,3 MNOK fra et tidligere innfridd Innovasjon Norge prosjekt (*ekstraordinært innovasjonstilskudd*).
- Sekundært, og da hovedsaklig dersom den store emisjonen skulle trekke ut, kan det være aktuelt å låne opp til 10 MNOK for å sikre driften fram til den store emisjonen er gjennomført. Mer om eventuelle lån i senere løypemeldinger.

Utfordringene med kapitalinnhenting ble betraktet kort i forrige løypemelding, og vi har noen flere betraktninger:

- 1 MNOK er en stiv inngangspris. Med 500 KNOK inngangspris ville vi potensielt hatt 4-6 MNOK tegnet på nåværende tidspunkt.
- Flere større investorer venter på at andre større investorer skal investere først.
- Vi er kommet for langt for de fleste seed-fond og for kort for de fleste industrielle investeringsselskap.
- Noen profesjonelle investorer kunne nok tenke seg en 3dje parts verdivurdering.
- Markedets appetitt på ESG aksjer har gått nedover i løpet av 2021, spesielt mot slutten av året. For flytende solkraft ble dette spesielt aksellerert av at en konkurrent av Sunlit Sea hadde en ulykke på et av sine anlegg i sommer. Generelt har investorer flyttet investeringer over i verdiaksjer, og ESG er i hovedsak risikoaksjer.
- Sunlit Sea har et omfattende budskap som tar tid å formidle. Emisjonen har sannsynligvis vært underbemannet, gjennomført for raskt og markedsført for bredt i stedet for mer rettet mot enkeltinvestorer.

På den positive siden skal det også nevnes at vi har oppnådd med mange spennende investorer som potensielt kan bli med i neste emisjon.

Den store emisjonen i 2022 vil fortsatt gå som planlagt. Sunlit Sea har signert kontrakt med Ernst & Young (EY) for en kapitalinnhenting på ca 200 MNOK. Prosessen med å velge finansiell rådgiver har pågått over et par måneder hvor totalt 7 rådgivere har blitt vurdert, og EY ble vurdert til å være den beste matchen etter en

grundig helhetsvurdering. Kick-off for denne prosessen var 29. desember, og i løpet av de kommende ukene planlegges prosessen i detalj. Den foreløpige tidslinjen indikerer en ferdigstillelse ca juni 2022.

Sjøsetting av prototype 5 ble opprinnelig planlagt rett før jul men måtte flyttes til januar pga to faktorer:

- Kvaliteten på den manuelle sveisen brukt i prototypen.
- Kvaliteten på materialet i koblingspunktene i lav temperatur.


Begge faktorene er utbedret og sjøsetting er planlagt innen et par uker.

En ny batch av halvdeler av flottører er produsert hos Whiston Industries. Disse halvdelene av flottører skal ikke sveises manuelt, men sendes slik de er til henholdsvis Oslo for anodisering og The Welding Institute for friksjonssveising. Video kommer senere.



The Welding Institute har omsider lykket med å sammenføye en flottør med bruk av friksjonssveising. Dette er en stor milepæl og den mest nærliggende løsningen for sammenføring av flottører - selv om liming, cinching, breting og cold-metal-transfer fortsatt vurderes. Friksjonssveising er en effektiv metode for å produsere en 100% vanntett søm, og er en mye brukt teknikk i marin sammenheng. Grunnen til at TWI har brukt en del tid på dette, er at friksjonssveising krever at delene ligger veldig tett, og at ujevnheter i aluminiumet etter pressing dermed viste seg å være utfordrende å jobbe med. TWI løste dette med en elegant clamping mekanisme. Se video:

<https://drive.google.com/file/d/1-sp7DTr7jH5Cg6S-RbzPbRJOOr0dhVDBa>

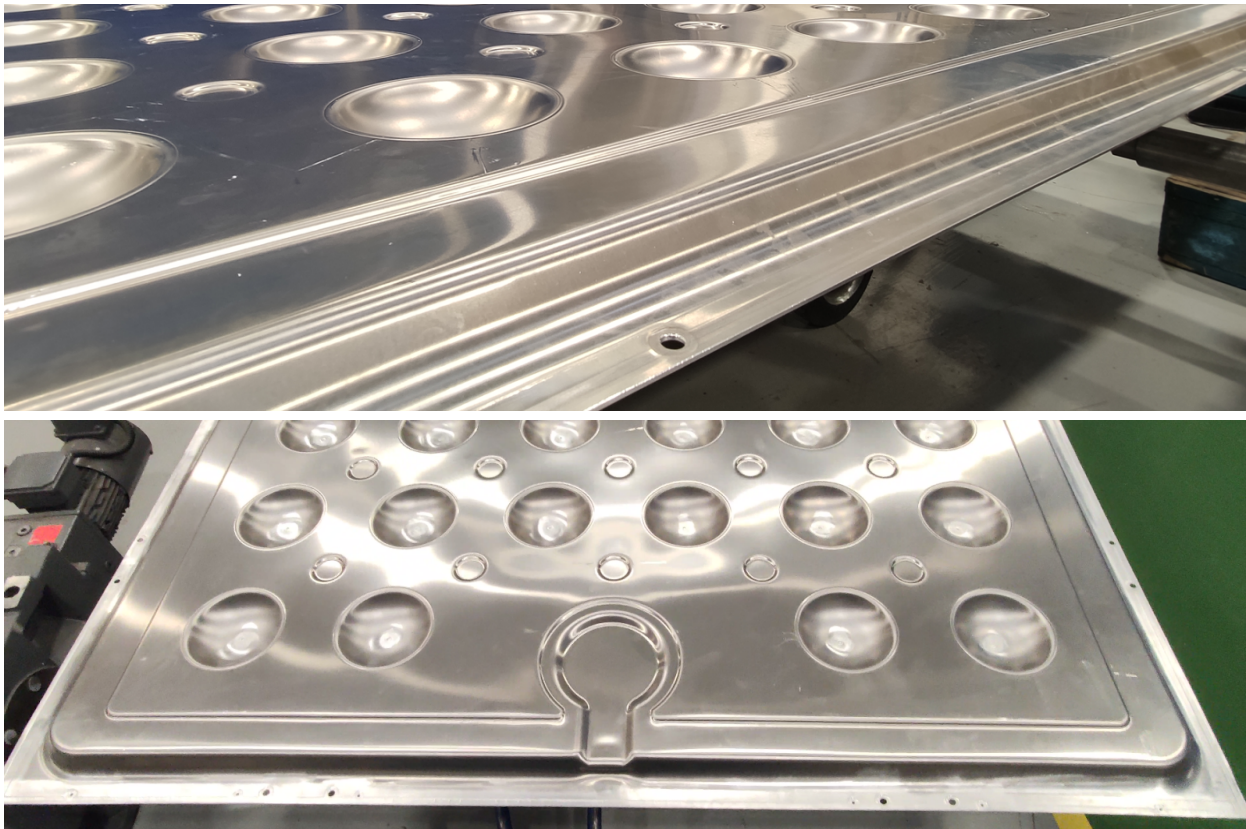

Sunlit Sea har ansatt den andre fulltids produksjonsassistenten, Jonas Solheim, med oppstart 1. februar. Jonas er tidligere gullsmed, låsesmed og kan svakstrøm, formpressing og generell produksjon. Produksjonsteamet i Oslo består nå av Guillaume Kegelart som produksjonsleder (fulltid), Karim Jablili som produksjonsassistent (deltid, foreløpig), og Jonas Solheim som produksjonsassistent (fulltid).

Den semiautomatiserte produksjonslinjen er i rute. Andron Handling i UK har mottatt ferdige flottører fra oss som de bruker i testing av produksjonslinjen, og oppdateringer vi har mottatt fra dem så langt ser lovende ut. Guillaume drar over til UK for inspeksjon i februar. I Oslo har vi simulert hvordan produksjonen vil bli etter den semiautomatiske produksjonslinjen blir installert.



Vi har hatt et par møter med Statkraft, og har innledet dialog om å bygge en prototyp hos Statkraft Tofte AS på Tofte næringspark. Prototypen er planlagt i to iterasjoner, først innaskjærs og deretter i mer eksponert vann lenger sør. Det er positivt at Statkraft viser interesse da de tidligere har vært en sterk proponent av en av våre konkurrenter.



Vi har også innledet dialog med Herøya Industripark, nærmere bestemt Seidr Energipark, om en prototyp som blir å ligge i Gunnekleivfjorden som del av en testtrigg for fornybare energisystemer. Seidr Energipark skal installere 27 000 kvm med flytende solkraft for å dekke energibehovet til et testanlegg med hydrogenproduksjon, batterier, brenselceller, og lading av el-busser på natten.



SEIDR Energipark

- Et område for testing og utprøving
- Alle energikilder og bærere koblet sammen
- Storskala forbruker

Speira (tidligere Hydro Rolled Products) har forpliktet aluminiumsleveransen til Sunlit Sea for 2022, til tross for manko på aluminium på verdensbasis, noe vi er svært fornøyd med. Til nå har vi brukt kinesisk aluminium, og vi vil fortsette å ha kinesisk aluminium som backup, og gå over til Speira som primærleverandør, gitt at presstester av materialet fungerer ekvivalent med det kinesiske. Speira kjøper aluminium fra Norsk Hydro, og ambisjonen er å få til en panteordning på aluminiumet som garanterer resirkulering og potensielt kan få ned prisen, samtidig som det er et positivt miljøtiltak.

Markedsansvarlig Christoffer er godt i gang med promotering av selskapet på LinkedIn, web og gjennom publiserte artikler. Siste artikkel er intervjuet som Try gjorde av CEO Per Lindberg før jul, som nå er publisert på Innovasjon Norges hjemmesider:

<https://www.innovasjon norge.no/no/tjenester/kundehistorier/2022/sunlit-sea/>

I løpet av januar publiseres også en revidert webside.

Solcellespesialisten (Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS) er et selskap med godt fotfeste i den norske solcellebransjen. Sunlit Sea og Solcellespesialisten har innledet dialog om et samarbeid om salg og markedsføring av solcelleinstallasjoner. Dette passer godt med go-to-market strategien til Sunlit Sea. Vi ønsker å fokusere på teknologileveranser samtidig som vi iterativt forbedrer vårt produkt, og da er det naturlig med partnere som kan ta prosjektering, kundedialog og annet som inngår i *Engineering, Procurement and Construction*. Den skisserte avtalen hindrer dog ikke Sunlit Sea fra å etablere egne prosjekter med kunder.

Vi har revidert milepælsplanen for de kommende måneder:

- **2022.02** Prototype 5. Exposed location. Wave corrected performance ratio.
- **2022.02** DNV verification according to recommended practice DNV-RP-0584.
- **2022.03** Deployment technique established and completed.
- **2022.03** Wave tank test with full size floats.
- **2022.03** Production line version 2 (semi-auto) established.
- **2022.03** Commercial grade hinges.

- **2022.03** Prototype 6. Very exposed location. Complete operation.
- **2022.04** Share sales, private or public offering, 200 MNOK.
- **2022.04** Prototype 7. Power production for a potential customer.
- **2022.05** Pilot 1. 20 kWp.
- **2022.06** Pilot 2. 50 kWp.
- **2022.07** Prototype 8. Power production for a potential customer.
- **2022.08** End of life assessment protocol established.
- **2022.08** Pilot 3. 100 kWp.
- **2022.09** Decommissioning technique established and completed.
- **2022.09** Pilot 4. 200 kWp.
- **2022.08** Prototype 9. Module level power electronics for rapid shutdown.
- **2022.11** Prototype 10. Pushing the limits with regard to environmental exposure.
- **2022.10** Production line version 3 (fully automated) established.
- **2022.10-12** Commercial installations: 2 MWp.
- **2023** Significant improvement in cycle rate and quality, new or updated factory.
- **2023** Install 100 MWp throughout the year.
- **2024** Gaining significant market shares and scaling.

Mvh



Per Lindberg, CEO

sunlitsea.no | +47 970 79 523

--

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Sunlit Sea Investors" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to investors+unsubscribe@sunlitsea.no.
